



Informe sobre el
avance en las obras de
**Reconstrucción
del Patrimonio
Cultural**
de los Pueblos
Originarios de la
Ciudad de México

Abril 2022

Recurso ejercido


Recursos aprobados	133,090,789.66
Recursos comprometidos	132,262,778.40
Recursos ejercidos	120,369,318.60

Obras concluidas 18

1. Parroquia de San Bernabé Apóstol, San Bernabé Ocotepec, M. Contreras
2. Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Topilejo, Tlalpan.
3. Templo de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.
4. Templo de Santa María Nativitas, Santa María Nativitas Zacapa, Alcaldía Xochimilco
5. Templo de San Matías, Barrio de la Asunción, Iztacalco
6. Santa Ana, Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.
7. San Miguel Arcángel, San Miguel Ajusco, Tlalpan
8. Templo de Santa Cruz, Santa Cruz Acalpíxca, Xochimilco
9. Capilla del Peñón de los Baños
10. Rectoría de la Inmaculada Concepción, Magdalena Atlític, Magdalena Contreras
11. Templo de Santísima Trinidad, Santiago Tulyehualco
12. Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir, San Lorenzo Acopilco
13. Templo de San Pablo Apóstol, San Pablo Oztotepec, Milpa Alta
14. Templo de Santiago Tlatelolco, Cuauhtémoc
15. San Bernardino de Siena, Xochimilco.
16. Templo de San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco
17. Conjunto de San Juan de los Lagos, Santiago Tulyehualco, Xochimilco
18. Templo de San Antonio, San Antonio Tecómitl, Milpa Alta

Obras en proceso..... 3

1. Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco
2. Templo de la Asunción de María, Villa Milpa Alta
3. Parroquia de San Fernando Rey, Cuauhtémoc

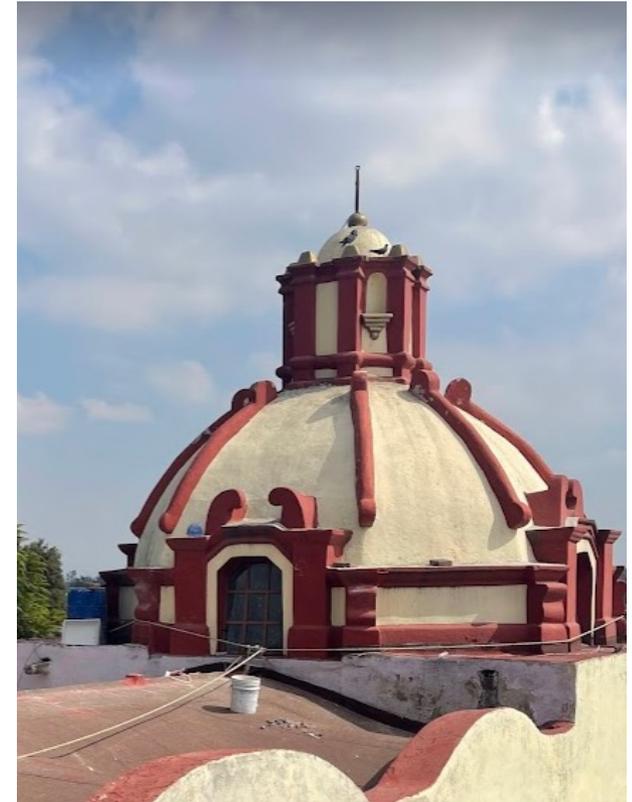

Recurso comprometido

132,262,778.40

Recurso ejercido

120,369,218.60

Alcaldía Xochimilco



Xochimilco. Cabecera
Templo de San Bernardino de Siena100%
Conclusión: 12 de junio de 2021

Santa Cruz Acalpixa
Templo de la Santa Cruz 100%
Conclusión: 11 de septiembre de 2020

Santa María Nativitas Zacapa
Templo de Santa María Nativitas 100%
Conclusión: 02 de octubre de 2020

Santiago Tulyehualco
Templo de la Santísima Trinidad Tulyehualco100%
Conclusión contrato: 28 de agosto de 2020
Conclusión convenio: 4 de diciembre de 2020

Templo y Capilla de San Juan de los Lagos 100%
Conclusión: 31 de octubre de 2021

San Luis Tlaxialtemalco
Templo de San Luis Obispo de Tolosa.....100%
Conclusión: 08 de octubre de 2021

San Gregorio Atlapulco
Templo de San Gregorio Magno.....89%
Conclusión: *se solicita reprogramación de término de los trabajos

Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco Alcaldía Xochimilco



Inicio de obra:
24 de agosto de 2020

Conclusión de obra:
Junio 2022

- Reconstrucción de torre campanario

Alcaldía Milpa Alta



Santa Ana Tlacotenco

Templo de Santa Ana Tlacotenco 100%
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

San Pablo Oztotepec

Templo de San Pablo Apóstol100%
Conclusión: 18 de abril de 2021

*Tiene una etapa subsecuente de trabajos con SEDATU.

San Antonio Tecómitl

Templo de San Antonio de Padua100%
Conclusión: 19 de noviembre de 2021

Villa Milpa Alta

Templo y antiguo convento de la Asunción de María 64%
Conclusión:

*Solicita reprogramación de fecha de Término de los trabajos

Alcaldía Tlalpan



San Miguel Topilejo.

Templo de San Miguel Arcángel 100%
Conclusión: 22 de septiembre de 2020

Santo Tomás Ajusco

Templo de Santo Tomás Apóstol 100%
Conclusión 12 de septiembre de 2020

San Miguel Ajusco

Templo de San Miguel Arcángel100%
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

Alcaldía Magdalena Contreras



San Bernabé Ocoatepec

Parroquia de San Bernabé Ocoatepec 100%

Conclusión: 24 de junio de 2020

Magdalena Atlitic

Rectoría de la Inmaculada Concepción100%

Conclusión: 18 de diciembre de 2020

Seguimiento de obras

Alcaldía Cuajimalpa



San Lorenzo Acopilco

Templo y Capilla de San Lorenzo Diácono y Mártir.....100%

Conclusión: 31 de marzo de 2021

*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

Alcaldía Iztacalco



Barrio de la Asunción, Iztacalco

Templo de San Matías Iztacalco100%

Conclusión: 27 de noviembre de 2020

*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

Alcaldía Venustiano



Peñón de los Baños

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe100%

Conclusión: 25 de diciembre de 2020

*Se ejerció una segunda etapa con recurso de SEDATU ya termianda.

Alcaldía Cuauhtémoc



Tlatelolco

Templo de Santiago Tlatelolco100%

Conclusión: 30 de abril de 2021

Guerrero

Parroquia de San Fernando Rey56%

Conclusión:

31 de agosto de 2022

Parroquia de San Fernando Rey, Alcaldía Cuauhtémoc




Inicio de obra:
16 de marzo de 2021

Conclusión de obra:
31 de agosto de 2022

*Contratista solicita prórroga de
término de los trabajos por
autorizaciones y procesos de obra.

- Inyecciones de grietas en cubiertas
- Restitución de aplanados al interior del templo

Avance físico financiero al mes de abril de 2022

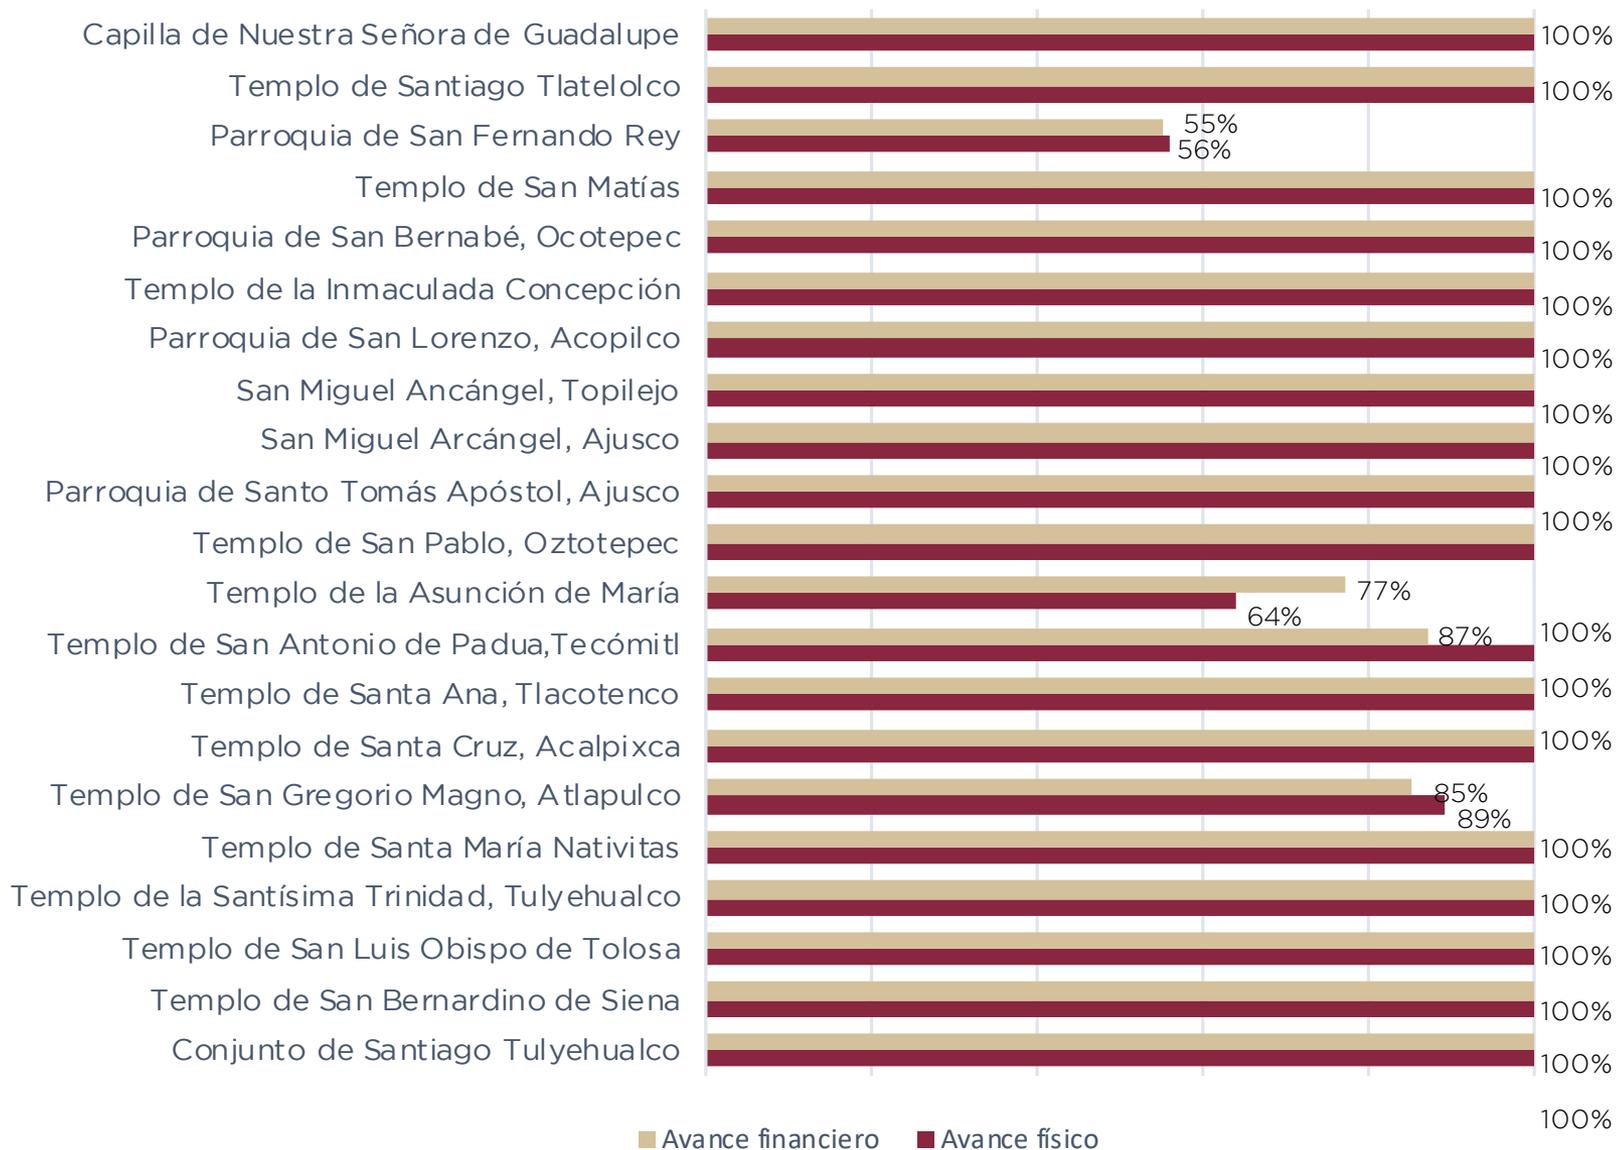



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN
