



# Recurso ejercido

Recursos aprobados ..... 133,090,789.66

Recursos comprometidos ..... 132,262,778.40


Recursos ejercidos ..... 114,005,012.17

Obras concluidas ..... 18

1. Parroquia de San Bernabé Apóstol, San Bernabé Ocotepec, M. Contreras
2. Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Topilejo, Tlalpan.
3. Templo de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.
4. Templo de Santa María Nativitas, Santa María Nativitas Zacapa, Alcaldía Xochimilco
5. Templo de San Matías, Barrio de la Asunción, Iztacalco
6. Santa Ana, Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.
7. San Miguel Arcángel, San Miguel Ajusco, Tlalpan
8. Templo de Santa Cruz, Santa Cruz Acalpíxca, Xochimilco
9. Capilla del Peñón de los Baños
10. Rectoría de la Inmaculada Concepción, Magdalena Atlític, Magdalena Contreras
11. Templo de Santísima Trinidad, Santiago Tulyehualco
12. Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir, San Lorenzo Acopilco
13. Templo de San Pablo Apóstol, San Pablo Oztotepec, Milpa Alta
14. Templo de Santiago Tlatelolco, Cuauhtémoc
15. San Bernardino de Siena, Xochimilco.
16. Templo de San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco
17. Conjunto de San Juan de los Lagos, Santiago Tulyehualco, Xochimilco
18. Templo de San Antonio, San Antonio Tecómitl, Milpa Alta

Obras en proceso..... 3

1. Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco
2. Templo de la Asunción de María, Villa Milpa Alta
3. Parroquia de San Fernando Rey, Cuauhtémoc

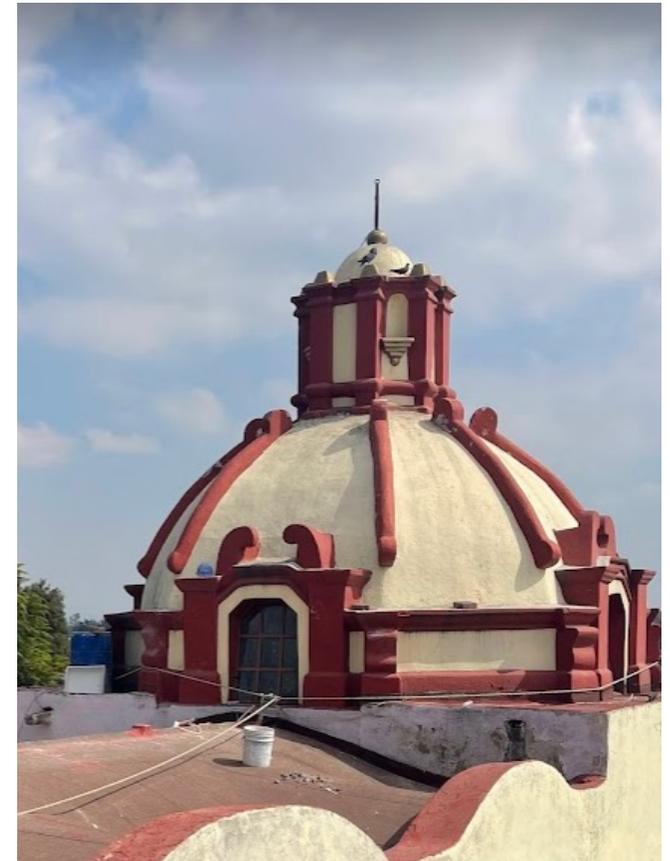

Recurso comprometido  
**132,262,778.40**

Recurso ejercido  
**114,005,012.17**

# Seguimiento de obras

## Alcaldía Xochimilco



Xochimilco. Cabecera  
Templo de San Bernardino de Siena .....100%  
Conclusión: 12 de junio de 2021

Santa Cruz Acalpixca  
Templo de la Santa Cruz ..... 100%  
Conclusión: 11 de septiembre de 2020

Santa María Nativitas Zacapa  
Templo de Santa María Nativitas ..... 100%  
Conclusión: 02 de octubre de 2020


Santiago Tulyehualco  
Templo de la Santísima Trinidad Tulyehualco .....100%  
Conclusión contrato: 28 de agosto de 2020  
Conclusión convenio: 4 de diciembre de 2020

Templo y Capilla de San Juan de los Lagos ..... 100%  
Conclusión: 31 de octubre de 2021

San Luis Tlaxialtemalco  
Templo de San Luis Obispo de Tolosa.....100%  
Conclusión: 08 de octubre de 2021

San Gregorio Atlapulco  
Templo de San Gregorio Magno.....80%  
Conclusión: \*se solicita reprogramación de término de los trabajos

## Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco Alcaldía Xochimilco

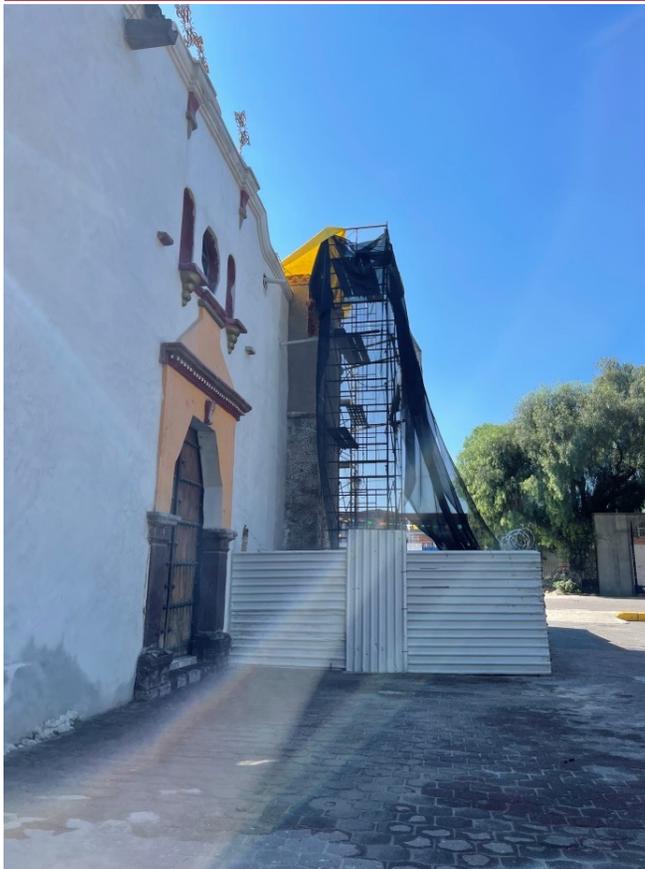

Inicio de obra:  
24 de agosto de 2020

Conclusión de obra:  
\*Contratista solicita prórroga  
debido a proceso de obra y  
revisión de alcances

- Reconstrucción de torre campanario.

## Alcaldía Milpa Alta



### Santa Ana Tlacotenco

Templo de Santa Ana Tlacotenco ..... 100%  
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

### San Pablo Oztotepec

Templo de San Pablo Apóstol .....100%  
Conclusión: 18 de abril de 2021

\*Tiene una etapa subsecuente de trabajos con SEDATU.

### San Antonio Tecómitl

Templo de San Antonio de Padua .....100%  
Conclusión: 19 de noviembre de 2021

### Villa Milpa Alta

Templo y antiguo convento de la Asunción de María 64%  
Conclusión:

\*Solicita reprogramación de fecha de Término de los trabajos

## Alcaldía Tlalpan



### San Miguel Topilejo.

Templo de San Miguel Arcángel ..... 100%  
Conclusión: 22 de septiembre de 2020

### Santo Tomás Ajusco

Templo de Santo Tomás Apóstol ..... 100%  
Conclusión 12 de septiembre de 2020

### San Miguel Ajusco

Templo de San Miguel Arcángel .....100%  
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

## Alcaldía Magdalena Contreras



### San Bernabé Ocoatepec

Parroquia de San Bernabé Ocoatepec ..... 100%

Conclusión: 24 de junio de 2020

### Magdalena Atlitic

Rectoría de la Inmaculada Concepción .....100%

Conclusión: 18 de diciembre de 2020

## Seguimiento de obras

### Alcaldía Cuajimalpa



#### San Lorenzo Acopilco

Templo y Capilla de San Lorenzo Diácono y Mártir.....100%

Conclusión: 31 de marzo de 2021

\*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

### Alcaldía Iztacalco



#### Barrio de la Asunción, Iztacalco

Templo de San Matías Iztacalco .....100%

Conclusión: 27 de noviembre de 2020

\*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

# Seguimiento de obras

## Alcaldía Venustiano



### Peñón de los Baños

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe .....100%

Conclusión: 25 de diciembre de 2020

\*Se ejerció una segunda etapa con recurso de SEDATU ya termianda.

## Alcaldía Cuauhtémoc



### Tlatelolco

Templo de Santiago Tlatelolco .....100%

Conclusión: 30 de abril de 2021



### Guerrero

Parroquia de San Fernando Rey .....39%

Conclusión:

\*Contratista solicita prórroga de término de los trabajos por autorizaciones y procesos de obra.

## Parroquia de San Fernando Rey, Alcaldía Cuauhtémoc

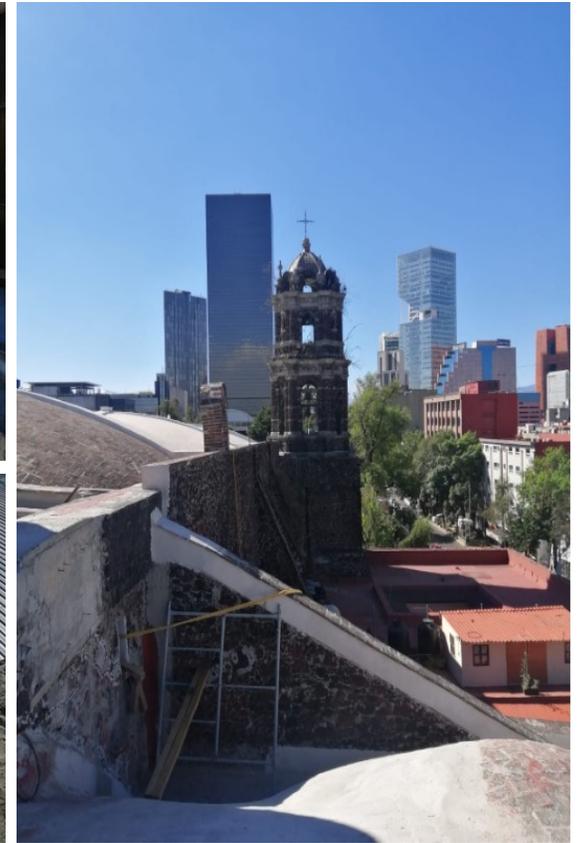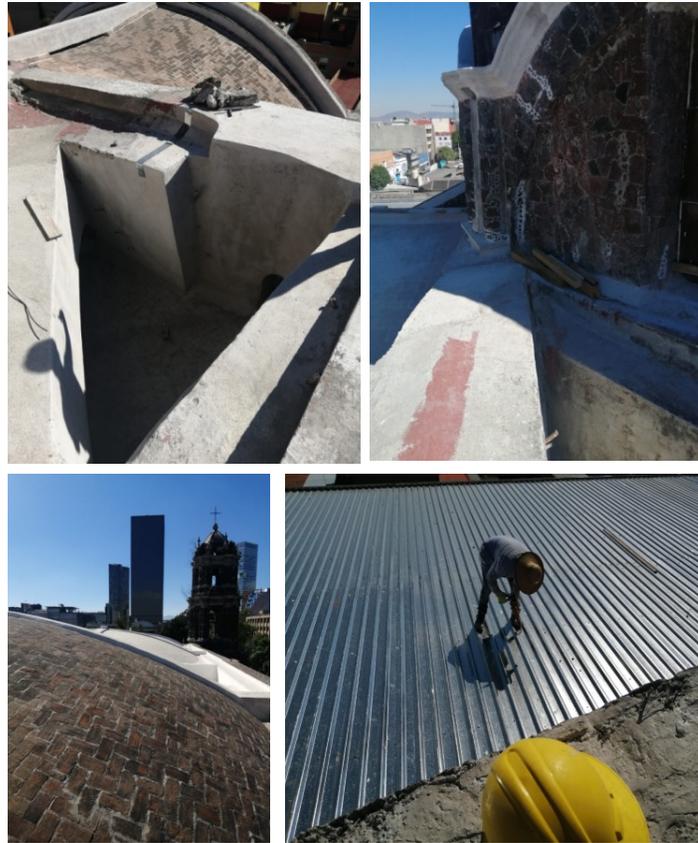


Inicio de obra:  
16 de marzo de 2021

Conclusión de obra:

\*Contratista solicita prórroga de término de los trabajos por autorizaciones y procesos de obra.

- Consolidaciones de diversas zonas en las cubiertas del inmueble
- Fabricación de cubierta de estructura metálica en anexos
- Aplicación de impermeabilizante en cubiertas

# Avance físico financiero al mes de enero de 2022

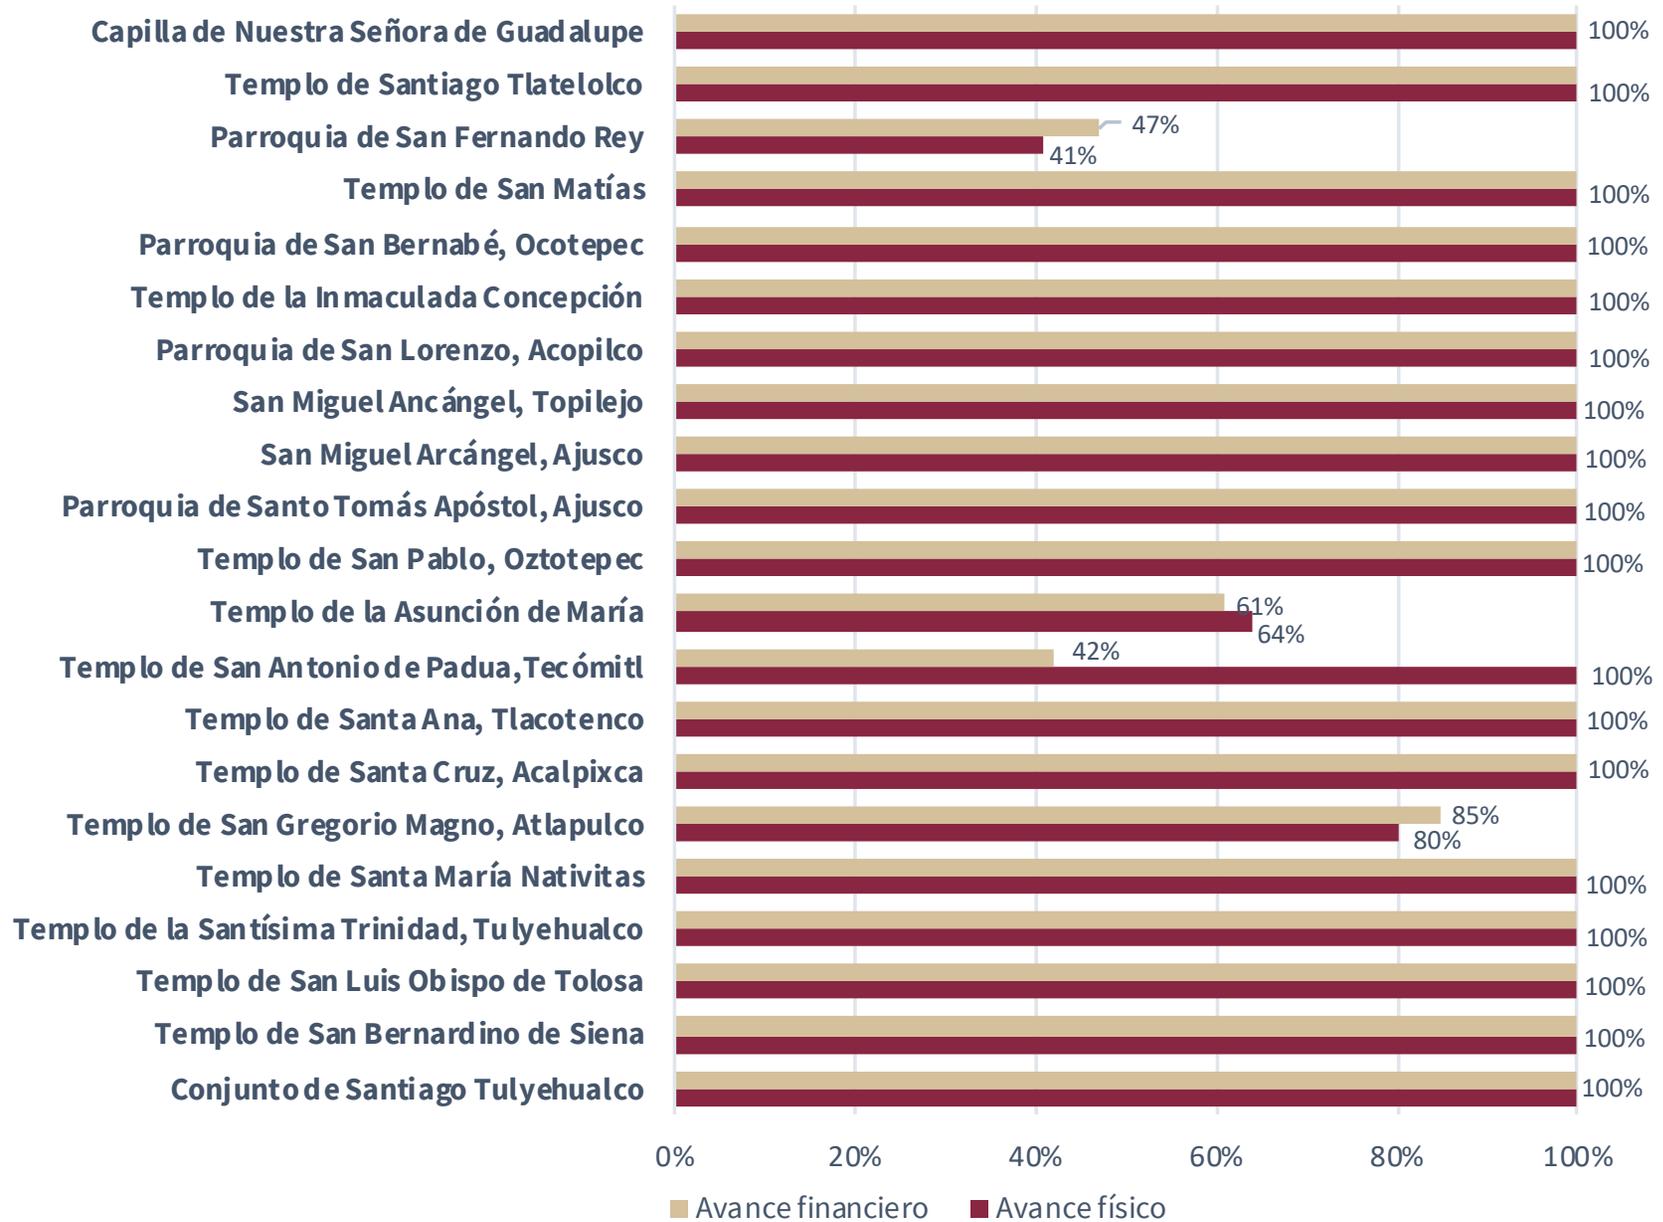



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA  
DE CULTURA

COMISIÓN PARA  
LA RECONSTRUCCIÓN
