



Informe sobre el avance en las obras de **Reconstrucción del Patrimonio Cultural** de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México

Julio 2020



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN



Recurso comprometido
130,530,358.61

Recurso ejercido
45,954,259.14

Recursos aprobados 133,441,201.24

Recursos comprometidos 130,530,358.61

- 21 contratos de obra
- 7 contratos de supervisión

Recursos ejercidos 45,954,259.14

Obras iniciadas 16

1. Parroquia de San Bernabé, San Bernabé Ocoatepec, Magdalena Contreras.
2. Templo de San Lorenzo Diácono y Mártir, San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa.
3. Templo y antiguo convento de Santiago Tlatelolco, Cuauhtémoc
4. Templo de San Antonio de Padua, Tecómitl. Milpa Alta
5. Templo de la Asunción de María, Villa Milpa Alta, Milpa Alta.
6. Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Topilejo, Tlalpan.
7. Templo de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.
8. San Miguel Arcángel, San Miguel Ajusco. Tlalpan
9. Templo de San Bernardino de Siena, Xochimilco.
10. Templo de la Santísima Trinidad, Tulyehualco, Xochimilco
11. Templo de Santa María Nativitas, Xochimilco.
12. Templo de la Santa Cruz, Santa Cruz Acalpixca. Xochimilco.
13. Templo de San Luis Obispo de Tolosa, Tlaxialtemalco, Xochimilco
14. Templo y antiguo convento de Santa Ana, Milpa Alta.
15. Templo de San Pablo Apóstol, San Pablo Oztotepec, Milpa Alta.
16. Templo de la Santísima Trinidad, Santiago Tulyehualco, Xochimilco.

Obras concluidas 1

- Parroquia de San Bernabé Apóstol, San Bernabé Ocoatepec, M. Contreras

Templo y antiguo convento de Santa Ana, Santa Ana Tlacotenco, Alcaldía Milpa Alta

Inicio de obra:
1 de julio de 2020


Conclusión de obra:
20 de noviembre de 2020



Templo de San Pablo Apóstol, San Pablo Oztotepec, Alcaldía Milpa Alta

Inicio de obra:
20 de julio de 2020

Conclusión de obra:
31 de diciembre de 2020

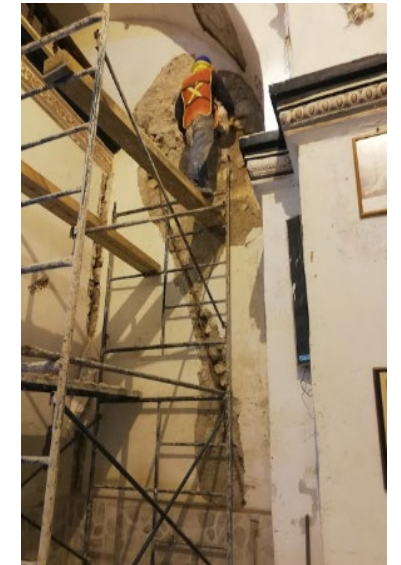

Obras iniciadas en el mes de julio


**Templo de San Juan de los Lagos
y Capilla de Santiago Apóstol,**

Santiago Tulyehualco,

Alcaldía Xochimilco

Inicio de obra:
16 de julio de 2020

Conclusión de obra:
18 de junio de 2021

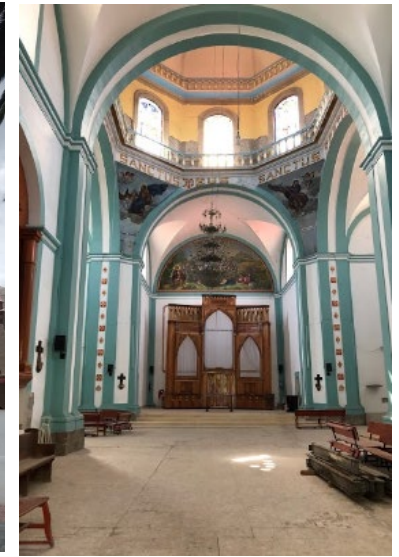

SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Alcaldía Xochimilco

Xochimilco. Cabecera

Templo de San Bernardino de Siena 37%

Conclusión: 15 de enero de 2021

Santa Cruz Acalpixca

Templo de la Santa Cruz 65%

Conclusión: 11 de septiembre de 2020

Santa María Nativitas Zacapa

Templo de Santa María Nativitas 45%

Conclusión: 16 de octubre de 2020

Santiago Tulyehualco

Templo de la Santísima Trinidad Tulyehualco 64%

Conclusión: 28 de agosto de 2020

Templo y Capilla de San Juan de los Lagos 17%

Conclusión: 18 de junio de 2021

San Luis Tlaxialtemalco 33%

Templo de San Luis Obispo de Tolosa

Conclusión: 16 de abril de 2021

San Gregorio Atlapulco 6%

Templo de San Gregorio Magno

Conclusión: 30 de abril de 2021

Seguimiento de obras



Inicio de obra:
13 de abril de 2020

Conclusión de obra:
15 de enero de 2021

Templo y antiguo convento de San Bernardino de Siena, Alcaldía Xochimilco.




Exploraciones arqueológicas



Liberación de piso de recinto



Liberación de piso de recinto

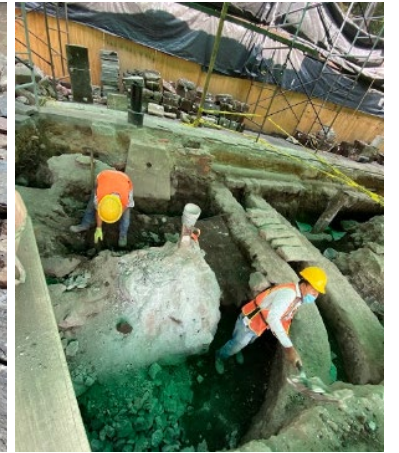

Exploraciones arqueológicas



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Seguimiento de obras



Templo de San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco



Consolidación de mampostería




Liberación de grietas

Inicio de obra:
11 de mayo de 2020

Conclusión de obra:
16 de abril de 2021



Liberación de grietas

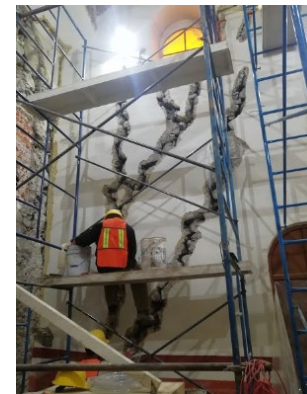

SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Seguimiento de obras



Templo Metodista de la Santísima Trinidad, Santiago Tultehuacán, Alcaldía Xochimilco



Suministro y colocación de apuntalamiento a base de polines y barrotes de madera de pino

Inicio de obra:
20 de abril 2020

Conclusión de obra:
17 de julio de 2020



Retiro de aplanado existente en muro de mampostería



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Seguimiento de obras



Templo de Santa María Nativitas, Santa María Nativitas Zacapa, Alcaldía Xochimilco



Consolidación de campanario



Liberación de grietas



Liberación de aplanados

Inicio de obra:
04 de mayo de 2020

Conclusión de obra:
16 de octubre de 2020



Inyección de grietas



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Seguimiento de obras



Parroquia de Santa Cruz Acalpixca, Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco



Reintegración de aplanados



Liberación de mampostería de torre campanario

Inicio de obra:
04 de mayo de 2020

Conclusión de obra:
11 de septiembre de 2020



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

MILPA ALTA

Alcaldía Milpa Alta

Santa Ana Tlacotenco

Templo de Santa Ana Tlacotenco 48%
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

San Pablo Oztotepec

Templo de San Pablo Apóstol 18%
Conclusión: 31 de diciembre de 2020

San Antonio Tecómitl

Templo de San Antonio de Padua 14%
Conclusión: 30 de abril de 2021

Villa Milpa Alta

Templo y antiguo convento de la Asunción de María 15%
Conclusión: 26 de junio de 2021

TLALPAN

Alcaldía Tlalpan

San Miguel Topilejo.

Templo de San Miguel Arcángel 60%
Conclusión: 25 de agosto de 2020

Santo Tomás Ajusco

Templo de Santo Tomás Apóstol 87%
Conclusión 12 de septiembre de 2020

San Miguel Ajusco

Templo de San Miguel Arcángel 21%
Conclusión: 18 de septiembre de 2020

Seguimiento de obras



Templo de San Antonio de Padua, San Antonio Tecómitl, Alcaldía Milpa Alta



Delimitación de área de trabajo



Retiro de mampostería



Labrado de piedra



Retiro de aplanado

Inicio de obra:
26 de mayo de 2020

Conclusión de obra:
30 de abril de 2021




SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Templo y antiguo convento de la Asunción de María, Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta

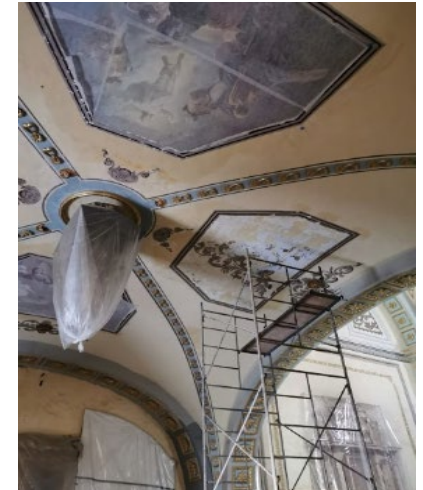

Inicio de obra:
27 de enero de 2020

Conclusión de obra:
26 de junio de 2021

Consolidaciones



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

Seguimiento de obras



Templo de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Ajusco, Alcaldía Tlalpan



Inicio de obra:
27 de enero de 2020

Conclusión de obra:
23 de junio de 2020



Construcción de escalera lateral



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Ajusco



Inicio de obra:
01 de junio de 2020

Conclusión de obra:
18 de septiembre de 2020

Elaboración de calas, apuntamientos y consolidaciones




SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

Seguimiento de obras



Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan

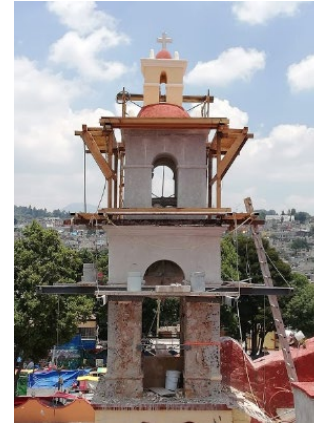

Trabajos de consolidación de torre campanario



Trabajos de consolidación de torre campanario

Inicio de obra:
25 de mayo de 2020

Conclusión de obra:
15 de junio de 2020



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Magdalena Contreras

MAGDALENA CONTRERAS

San Bernabé Ocoatepec

Parroquia de San Bernabé Ocoatepec 100%

Conclusión: 24 de junio de 2020

Magdalena Atlitlic

Rectoría de la Inmaculada Concepción 20%

Conclusión: 14 de noviembre de 2020

Cuajimalpa

CUAJIMALPA

San Lorenzo Acopilco

Templo y Capilla de San Lorenzo Diácono y Mártir. 79%

Conclusión: 27 de noviembre de 2020

Iztacalco

IZTACALCO

Barrio de la Asunción, Iztaalco

Templo de San Matías Iztaalco 24%

Conclusión: 27 de noviembre de 2020

Venustiano Carranza

VENUSTIANO CARRANZA

Peñón de los Baños

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe 16%

Conclusión: 25 de diciembre de 2020

Cuauhtémoc

CUAUHTÉMOC

Tlatelolco

Templo de Santiago Tlatelolco 19%

Conclusión: 31 de diciembre de 2020

Guerrero

Parroquia de San Fernando Rey 4%

Conclusión: 30 abril de 2021

Templo y capilla de San Lorenzo Diácono y Mártir, San Lorenzo Acopilco, Alcaldía Cuajimalpa



Inicio de obra:
10 de marzo de 2020


Conclusión de obra:
30 de octubre de 2020



Reintegración de aplanados



Liberación de grietas

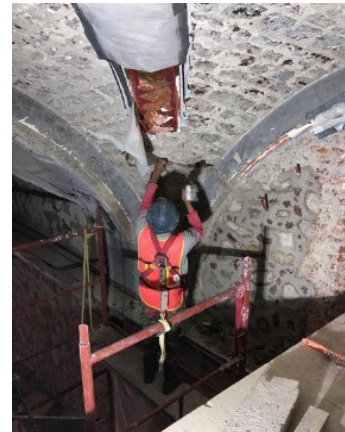


Protección de
ornamentaciones



Consolidación de mampostería



Avance físico y financiero al mes de julio

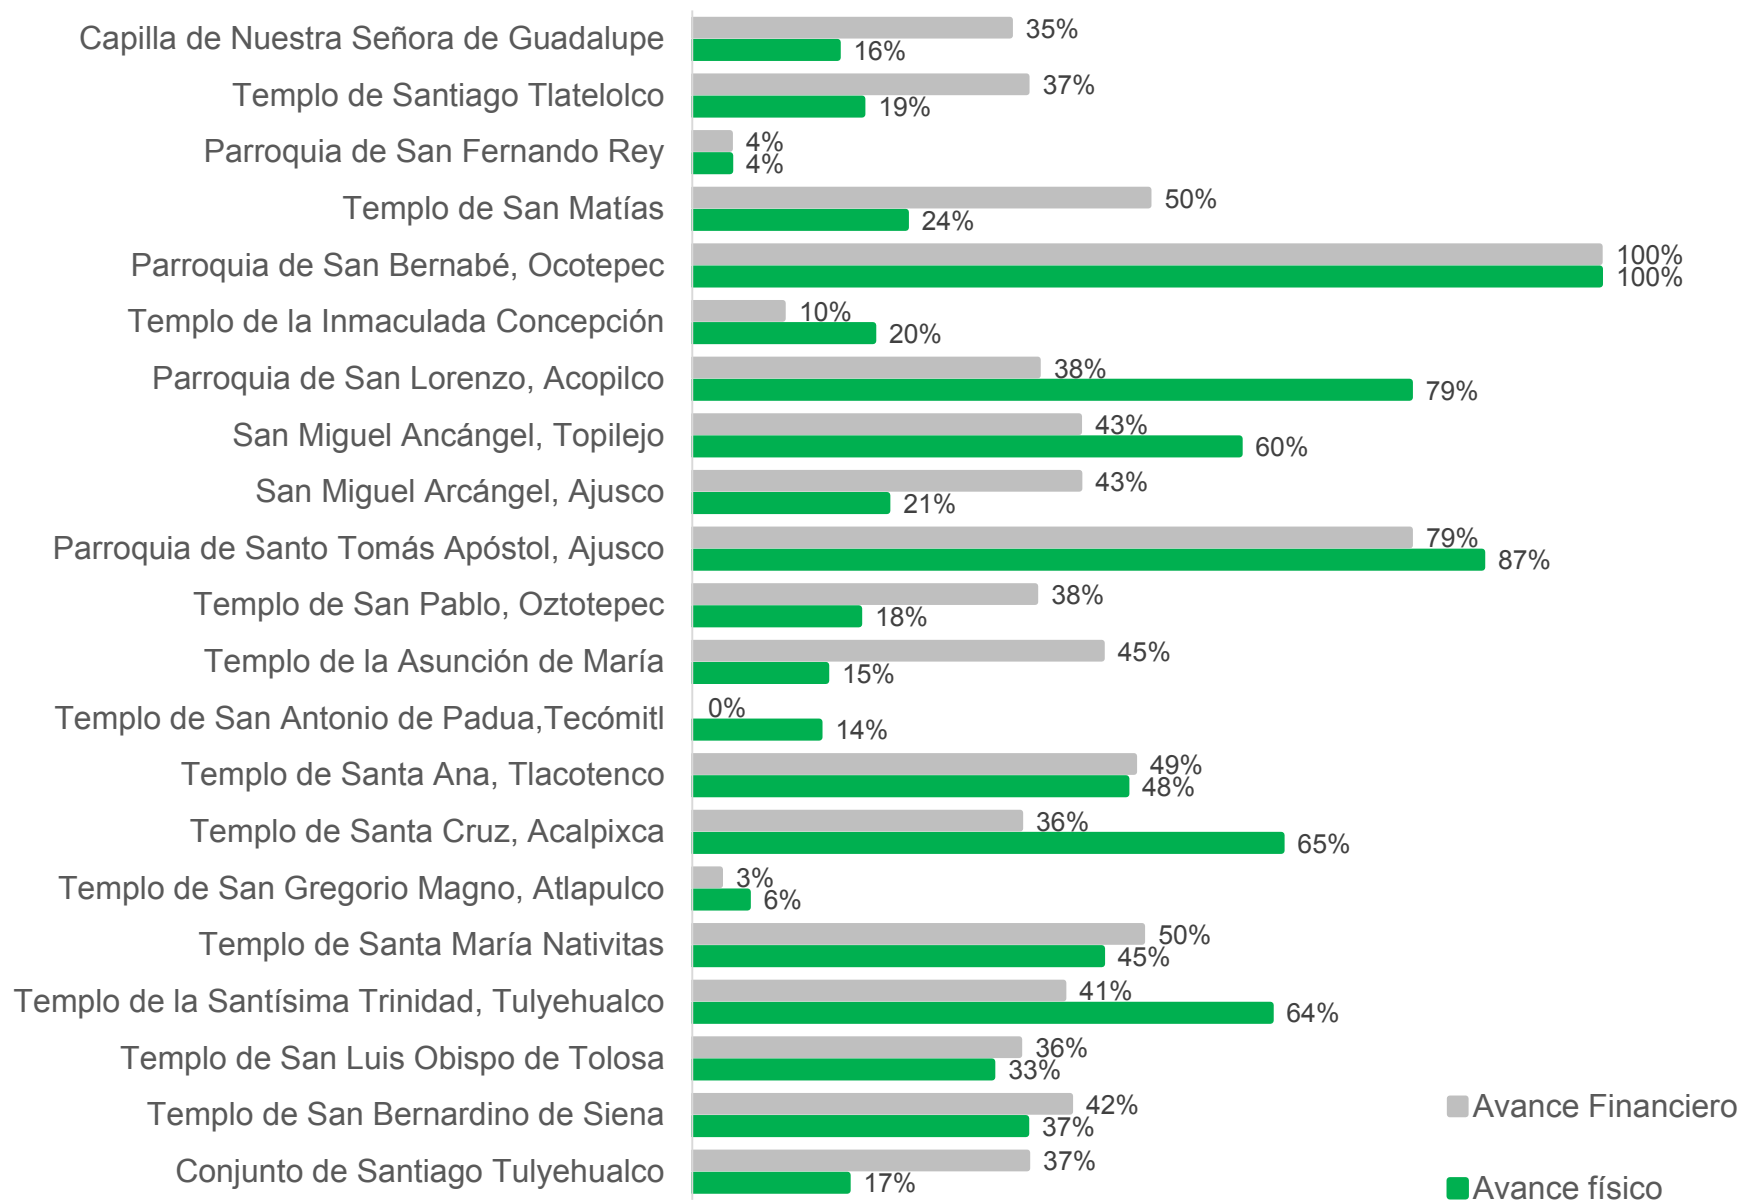



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN
