

Recurso ejercido

Recursos aprobados	133,090,789.66
Recursos comprometidos	133,090,778.40
Recursos ejercidos	123,281,248.33

Obras concluidas 18

1. Parroquia de San Bernabé Apóstol, San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Contreras
2. Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Topilejo, Tlalpan.
3. Templo de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.
4. Templo de Santa María Nativitas, Santa María Nativitas Zacapa, Xochimilco
5. Templo de San Matías, Barrio de la Asunción, Iztacalco
6. Santa Ana, Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.
7. San Miguel Arcángel, San Miguel Ajusco, Tlalpan
8. Templo de Santa Cruz, Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco
9. Capilla del Peñón de los Baños, Venustiano Carranza.
10. Rectoría de la Inmaculada Concepción, Magdalena Atlític, La Magdalena Contreras
11. Templo de Santísima Trinidad, Santiago Tulyehualco, Xochimilco
12. Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir, San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa.
13. Templo de San Pablo Apóstol, San Pablo Oztotepec, Milpa Alta
14. Templo de Santiago Tlatelolco, Cuauhtémoc
15. San Bernardino de Siena, Xochimilco.
16. Templo de San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco
17. Conjunto de San Juan de los Lagos, Santiago Tulyehualco, Xochimilco
18. Templo de San Antonio, San Antonio Tecómitl, Milpa Alta

Obras en proceso3

1. Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco
2. Templo de la Asunción de María, Villa Milpa Alta
3. Parroquia de San Fernando Rey, Cuauhtémoc



Recurso comprometido
133,090,778.40

Recurso ejercido
123,281,248.33

Seguimiento de obras

Alcaldía Xochimilco



Xochimilco. Cabecera

Templo de San Bernardino de Siena100%

Conclusión: 12 de junio de 2021

Santa Cruz Acalpixca

Templo de la Santa Cruz100%

Conclusión: 11 de septiembre de 2020

Santa María Nativitas Zacapa

Templo de Santa María Nativitas100%

Conclusión: 02 de octubre de 2020

Santiago Tulyehualco

Templo de la Santísima Trinidad Tulyehualco100%

Conclusión contrato: 28 de agosto de 2020

Conclusión convenio: 4 de diciembre de 2020

Templo y Capilla de San Juan de los Lagos100%

Conclusión: 31 de octubre de 2021

San Luis Tlaxialtemalco

Templo de San Luis Obispo de Tolosa..... 100%

Conclusión: 08 de octubre de 2021

San Gregorio Atlapulco

Templo de San Gregorio Magno 99%

Conclusión: *se solicita reprogramación de término de los trabajos

Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco Alcaldía Xochimilco



Inicio de obra:
24 de agosto de 2020



- **Reconstrucción de torre campanario**

Colocación de reloj, bocinas y campanario en torre.

Templo y Antiguo Convento de la Asunción de María, Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta



Inicio de obra:
27 de enero de 2020

- **Reconstrucción de Muros Perimetrales**
Suministro y colocación de escalones de piedra, Aplanado Pulido

Alcaldía Milpa Alta



Santa Ana Tlacotenco
Templo de Santa Ana Tlacotenco100%
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

San Pablo Oztotepec
Templo de San Pablo Apóstol 100 %
Conclusión: 18 de abril de 2021
*Tiene una etapa subsecuente de trabajos con SEDATU.

San Antonio Tecómitl
Templo de San Antonio de Padua 100 %
Conclusión: 19 de noviembre de 2021

Villa Milpa Alta
Templo y antiguo convento de la Asunción de María...70%
Conclusión:
*Solicita reprogramación de fecha de Término de los trabajos

Alcaldía Tlalpan



San Miguel Topilejo.
Templo de San Miguel Arcángel100%
Conclusión: 22 de septiembre de 2020

Santo Tomás Ajusco
Templo de Santo Tomás Apóstol100%
Conclusión 12 de septiembre de 2020

San Miguel Ajusco
Templo de San Miguel Arcángel100%
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

Alcaldía Magdalena Contreras



San Bernabé Ocotepc
Parroquia de San Bernabé Ocotepc100%
Conclusión: 24 de junio de 2020

Magdalena Atlitic
Rectoría de la Inmaculada Concepción100%
Conclusión: 18 de diciembre de 2020

Alcaldía Cuajimalpa



San Lorenzo Acopilco
Templo y Capilla de San Lorenzo Diácono y Mártir.....100%
Conclusión: 31 de marzo de 2021
*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

Alcaldía Iztacalco



Barrio de la Asunción, Iztacalco
Templo de San Matías Iztacalco 100 %
Conclusión: 27 de noviembre de 2020
*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

Seguimiento de obras

Alcaldía Venustiano Carranza



Peñón de los Baños

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe 100 %

Conclusión: 25 de diciembre de 2020

*Se ejerció una segunda etapa con recurso de SEDATU ya termianda.

Alcaldía Cuauhtémoc



Tlatelolco

Templo de Santiago Tlatelolco 100 %

Conclusión: 30 de abril de 2021

Guerrero

Parroquia de San Fernando Rey 76 %

Conclusión:

31 de agosto de 2022

Parroquia de San Fernando Rey, Alcaldía Cuauhtémoc




Inicio de obra:
16 de marzo de 2021

Conclusión de obra:
31 de agosto de 2022



- Trabajos de restauración y pintura en la ornamentación.
- Trabajos de limpieza y fumigación

Avance físico financiero al mes de julio de 2022

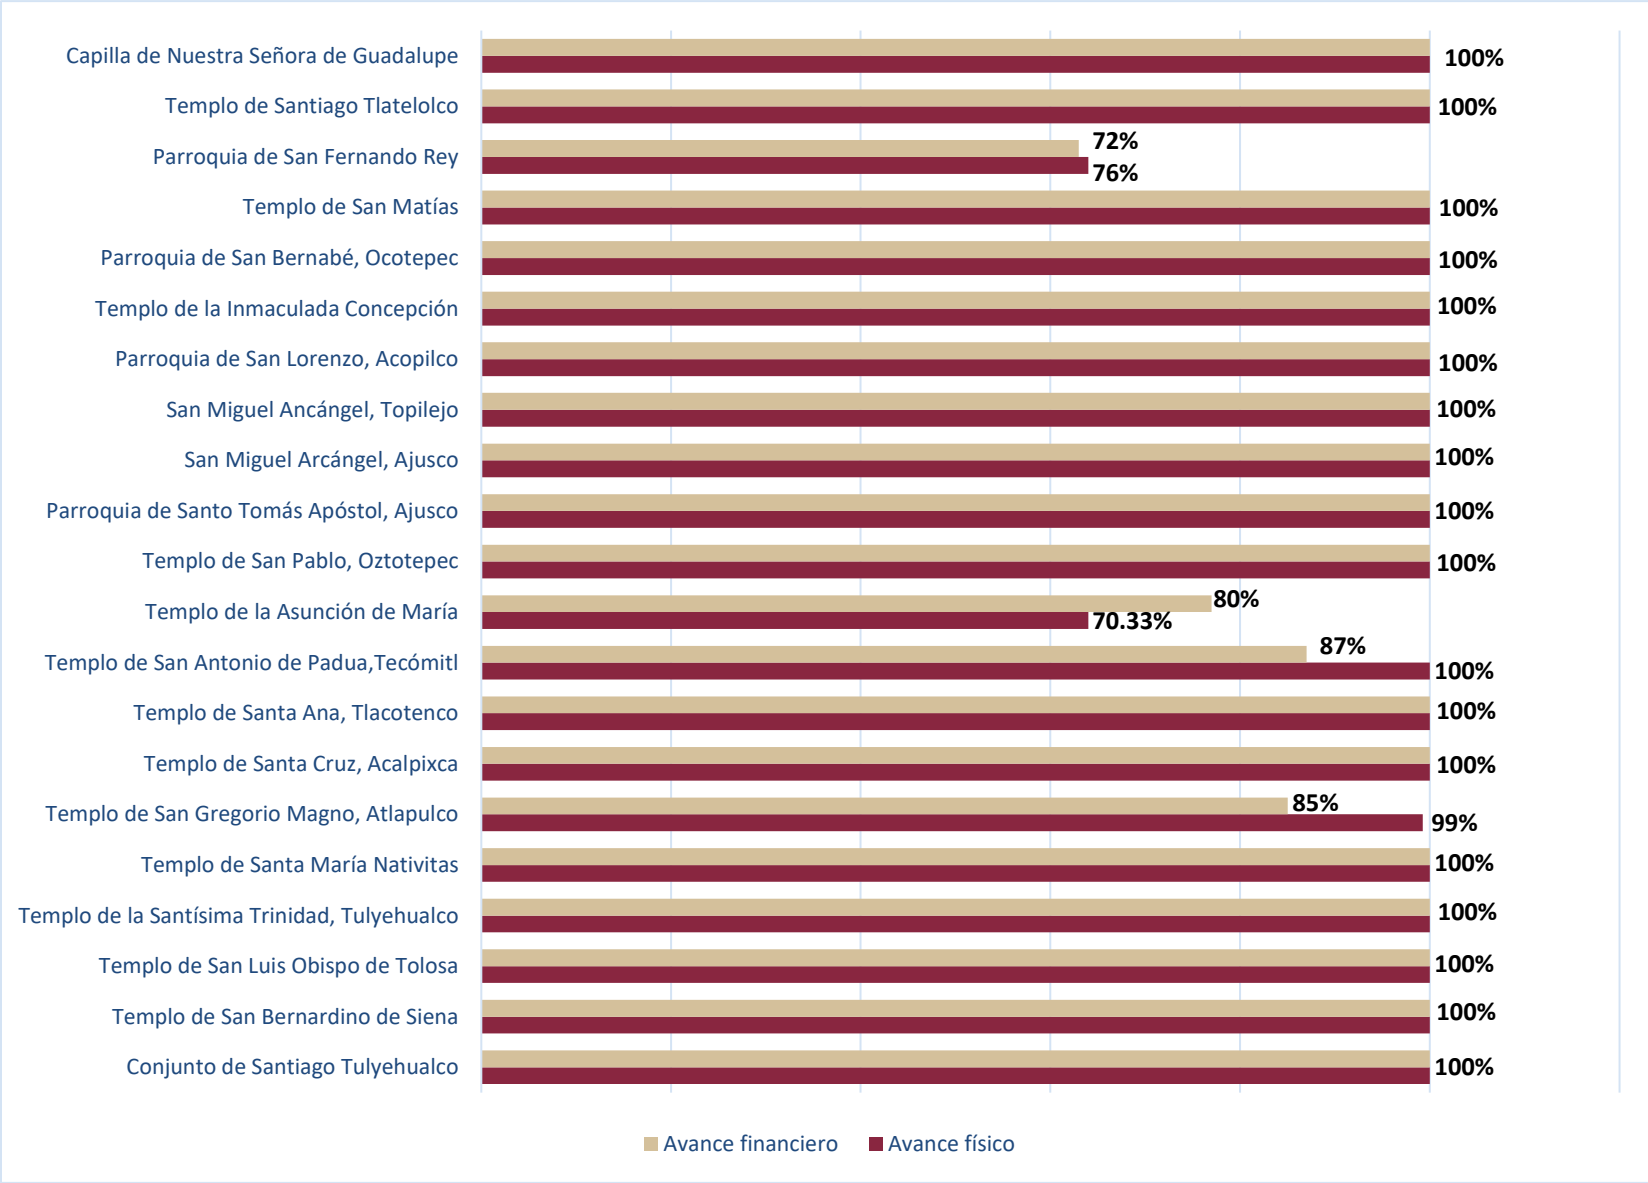



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN
