Informe sobre el avance en las obras de

Reconstrucción del Patrimonio Cultural

de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México

Mayo, 2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE CULTURA | COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Recurso ejercido

Recursos aprobados	**133,090,789.66**
Recursos comprometidos	**133,090,778.40**
Recursos ejercidos	**121,214,830.30**

Obras concluidas ……18

1. Parroquia de San Bernabé Apóstol, San Bernabé Ocotepec, M. Contreras
2. Templo de San Miguel Arcángel, San Miguel Topilejo, Tlalpan.
3. Templo de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.
4. Templo de Santa María Nativitas, Santa María Nativitas Zacapa, Alcaldía Xochimilco
5. Templo de San Matías, Barrio de la Asunción, Iztacalco
6. Santa Ana, Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.
7. San Miguel Árcángel, San Miguel Ajusco, Tlalpan
8. Templo de Santa Cruz, Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco
9. Capilla del Peñón delos Baños
10. Rectoría de la Inmaculada Concepción, Magdalena Atlític, Magdalena Contreras
11. Templo de Santísima Trinidad, Santiago Tulyehualco
12. Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir, San Lorenzo Acopilco
13. Templo de San Pablo Apóstol, San Pablo Oztotepec, Milpa Alta
14. Templo de Santiago Tlatelolco, Cuauhtémoc
15. San Bernardino de Siena, Xochimilco.
16. Templo de San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco
17. Conjunto de San Juan de los Lagos, Santiago Tulyehualco, Xochimilco
18. Templo de San Antonio, San Antonio Tecómitl, Milpa Alta

Obras en proceso…… 3

1. Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco
2. Templo de la Asunción de María, Villa Milpa Alta
3. Parroquia de San Fernando Rey, Cuauhtémoc

Recurso comprometido
133,090,778.40

Recurso ejercido
121,214,830.30

Alcaldía Xochimilco

Xochimilco. Cabecera
Templo de San Bernardino de Siena ……..……100%
Conclusión: 12 de junio de 2021

Santa Cruz Acalpixca
Templo de la Santa Cruz …… 100%
Conclusión: 11 de septiembre de 2020

Santa María Nativitas Zacapa
Templo de Santa María Nativitas ……..……. 100%
Conclusión: 02 de octubre de 2020

Santiago Tulyehualco
Templo de la Santísima Trinidad Tulyehualco ……..……100%
Conclusión contrato: 28 de agosto de 2020
Conclusión convenio: 4 de diciembre de 2020

Templo y Capilla de San Juan de los Lagos ……..... 100%
Conclusión: 31 de octubre de 2021

San Luis Tlaxialtemalco
Templo de San Luis Obispo de Tolosa……..…..……100%
Conclusión: 08 de octubre de 2021

San Gregorio Atlapulco
Templo de San Gregorio Magno……..99%
Conclusión: *se solicita reprogramación de término de los trabajos

Templo de San Gregorio Magno, San Gregorio Atlapulco
Alcaldía Xochimilco

Inicio de obra:
24 de agosto de 2020

Conclusión de obra:
Junio 2022

- **Reconstrucción de torre campanario**

Conclusión de pintura en toda la torre de acuerdo a la nueva distribución de colores solicitada por el INAH.

Alcaldía Milpa Alta

Santa Ana Tlacotenco
Templo de Santa Ana Tlacotenco …… 100%
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

San Pablo Oztotepec
Templo de San Pablo Apóstol ……..……100%
Conclusión: 18 de abril de 2021
*Tiene una etapa subsecuente de trabajos con SEDATU.

San Antonio Tecómitl
Templo de San Antonio de Padua ……..……100%
Conclusión: 19 de noviembre de 2021

Villa Milpa Alta
Templo y antiguo convento de la Asunción de María ……..…… 64%
Conclusión:
*Solicita reprogramación de fecha de Término de los trabajos

Alcaldía Tlalpan

San Miguel Topilejo.
Templo de San Miguel Arcángel …… ..……... 100%
Conclusión: 22 de septiembre de 2020

Santo Tomás Ajusco
Templo de Santo Tomás Apóstol …… .. ……..... 100%
Conclusión 12 de septiembre de 2020

San Miguel Ajusco
Templo de San Miguel Arcángel ……..…. ….100%
Conclusión: 20 de noviembre de 2020

Alcaldía Magdalena Contreras

San Bernabé Ocotepec
Parroquia de San Bernabé Ocotepec ……..... 100%
Conclusión: 24 de junio de 2020

Magdalena Atlitic
Rectoría de la Inmaculada Concepción ……..…..…100%
Conclusión: 18 de diciembre de 2020

Alcaldía Cuajimalpa

San Lorenzo Acopilco
Templo y Capilla de San Lorenzo Diácono y Mártir……100%
Conclusión: 31 de marzo de 2021
*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

Alcaldía Iztacalco

Barrio de la Asunción, Iztacalco
Templo de San Matías Iztacalco ……100%
Conclusión: 27 de noviembre de 2020
*Existe una segunda etapa de trabajos con recurso federal que aún no está programada.

Seguimiento de obras

Alcaldía Venustiano Carranza

Peñón de los Baños
Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe ……..100%
Conclusión: 25 de diciembre de 2020
*Se ejerció una segunda etapa con recurso de SEDATUya termianda.

Alcaldía Cuauhtémoc

Tlatelolco
Templo de Santiago Tlatelolco ……100%
Conclusión: 30 de abril de 2021

Guerrero
Parroquia de San Fernando Rey ……64%
Conclusión:
31 de agosto de 2022

Parroquia de San Fernando Rey, Alcaldía Cuauhtémoc

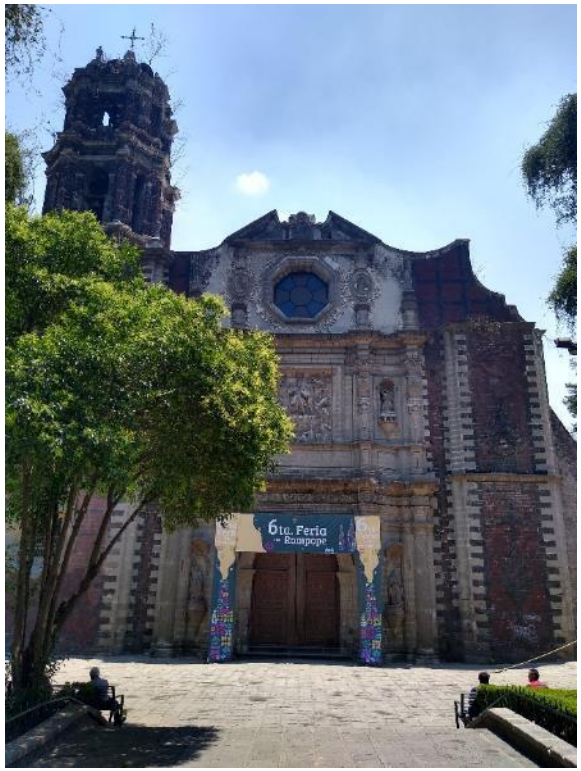

Inicio de obra:
16 de marzo de 2021

Conclusión de obra:
31 de agosto de 2022

*Contratista solicita prórroga de término de los trabajos por autorizaciones y procesos de obra.

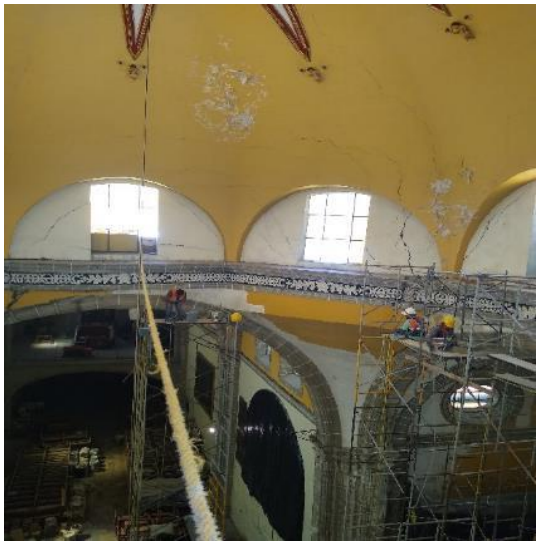

- Impermeabilización en cubierta de la nave principal.
- Trabajos de pintura en las pechinas de la nave principal

Avance físico financiero al mes de mayo de 2022

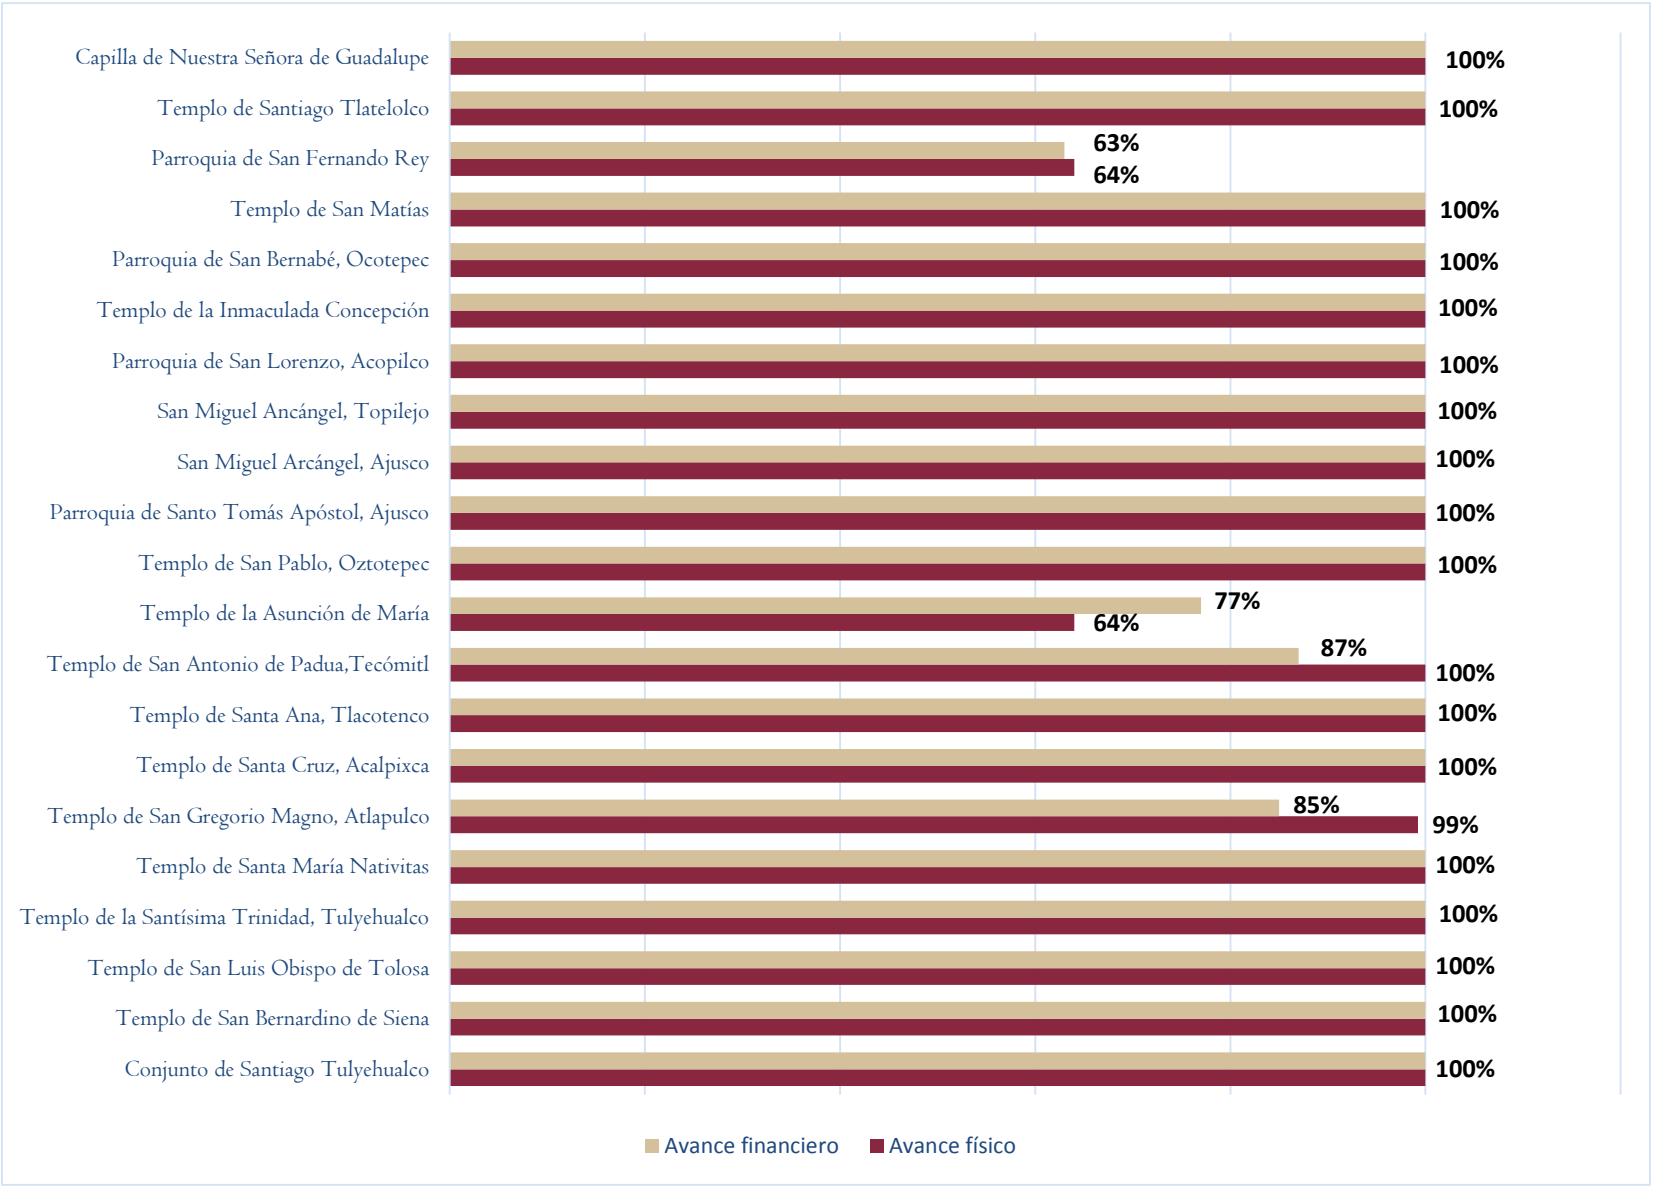

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA
DE CULTURA

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN
